№ п/п	Номер ордера	Заказчик	Адрес	Замечание	Дата отказа	Фотофиксация
I.	**Аварийные ордера**					
1	У-28855 от 18.10.2018	ПАО «Ленэнерго»	ул. Рылеева, д.11, лит. А	Восстановление плиточного мощения выполнено некачественно - швы не заполнены ЦПС, не закреплена гранитная плита.	15.11.18	
2	У-24027 от 31.07.2018	ПАО «Ленэнерго»	Столярный пер., д.16	Восстановление выполнено некачественно – просадка.	15.11.18	
3	У-28975 от 19.10.2018	СПб ГУП «Горэлектротранс»	пл. Ленина, д.8/8, лит. А	По ордеру с объемами работ в грунте, выполнены работы в зоне трамвайных путей-уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения. Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	16.11.18	
4	К-27414 от 24.09.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	пр. Большевиков, д.83, лит.А	Восстановление выполнено некачественно-нарушение плановых отметок установки б/к, сколы б/к. Не выполнены требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части п.11.5. (выполнено восстановление без перекрытия, адрес на гарантии).	16.11.18	

5	У-26529 от 06.09.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	пр. Большевиков, д.13, корп.1, лит. А	По ордеру с заявленными объемами в проезжей части выполнены работы в тротуаре. Восстановление выполнено некачественно-просадка, неровные кромки, выкрашивание.	16.11.18	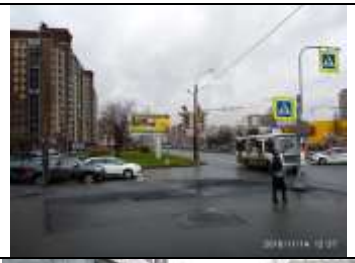
6	У-27920 от 03.10.2018	ПАО «Ленэнерго»	Новороссийская ул. у д.6 лит. Е по Политехнической ул.	Работы не завершены. Благоустройство не восстановлено.	16.11.18	
7	У-27393 от 24.09.2018	ПАО «Ленэнерго»	Новороссийская ул. у д.6 лит. Е по Политехнической ул.	Работы не завершены. Благоустройство не восстановлено.	16.11.18	
8	У-26876 от 13.09.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	пр. Большевиков, д.19, лит. Ш угол ул. Дыбенко	Восстановление выполнено некачественно – просадка. Уложенная асфальтобетонная смесь не идентична по свойствам и характеристикам существующей на адресе. Механические повреждения восстановленного покрытия.	16.11.18	
9	У-29908 от 02.11.2018	ПАО «Ленэнерго»	Шкиперский проток, д.17 по ул. Шевченко	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание, механические повреждения.	16.11.18	
10	У-30005 от 06.11.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Ул. Победы (г. Ломоносов), д.36, к.1, лит. А	Восстановление выполнено некачественно – трещина на примыкании, механические повреждения – пропилы, не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	19.11.18	

11	У-30182 от 08.11.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Железнодорожная ул., (г. Пушкин), д.40, лит. А	Восстановление выполнено некачественно-некачественное примыкание к существующему покрытию - разрушение шва сопряжения, не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	19.11.18	
12	У-30347 от 12.11.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Железнодорожная ул., (г. Пушкин), д.40а, лит. А	Не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	19.11.18	
13	У-30328 от 12.11.2018	АО «Оборонэнерго»	Макаровская ул. (г. Кронштадт) д.3, лит. А	Восстановление выполнено с замечаниями-механические повреждения – пропилы, не выполнены требования П.П. СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	20.11.18	
14	У-30321 от 12.11.2018	ГУП «ТЭК СПб»	Малая ул. (г. Пушкин), д.27/12, лит. А	Восстановление выполнено некачественно - выкрашивание, швы б/к не заполнены цементным раствором, не соответствует марка б/к.	20.11.18	
15	У-30374 от 13.11.2018	ГУП «ТЭК СПб»	Тверская ул. (г. Колпино)	Восстановление выполнено некачественно – локальные просадки.	20.11.18	

II.	Плановые ордера					
1	У-11290 от 15.10.2018	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Пр. Маршала Блюхера, пр. Луначарского, пр. Мечникова.	Пр. Мечникова, напротив д.3: Восстановление выполнено некачественно – просадка. Пр. Луначарского в районе д.78/1: Не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения и проезд велосипедистов.	16.11.18	
2	У-12964 от 26.12.2017	ООО «Ковер»	Ул. Обручевых, д.5, лит. А	Механические повреждения примыкающего покрытия, пропилы, не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	16.11.18	
3	У-7181 от 28.05.2018	Местная администрация МО МО Правобережный	Ул. Бадаева, д.1 - д.3 – ул. Коллонтай, д.12 – д.14	Ремонт покрытий выполнен с замечаниями-не восстановлена штроба после установки б/к, загрязнение вяжущими материалами шва сопряжения с существующим покрытием, швы б/к не заполнены цементным раствором, не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	16.11.18	
4	У-9919 от 22.08.2018	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»	Ул. Чапаева, уч.23, ул. Рентгена.	Восстановление выполнено некачественно – просадка.	20.11.18	

5	У-10461 от 10.09.2018	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Собственный пр. от бул. Красных Курсантов до Красноармейского пер.	Ремонт покрытий выполнен с замечаниями- нарушение высотного положения люков и коверов, нарушение плановых отметок установки б/к, сколы б/к, механические повреждения - пропилы, трещины, не обеспечен водоотвод в местах установки спец. камня, локальные застои воды в тр-ре, локально не восстановлено а/б покрытие, выкрашивание, не обеспечен безопасный проход пешеходов и маломобильных групп населения.	20.11.18	
6	У-9945 от 30.10.2017	СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	Автовская ул., д.2	Не установлен павильон ожидания городского пассажирского транспорта.	21.11.18	
7	У-10510 от 12.09.2018	ГУП «Водоканал СПб»	Кубинская ул., уч. 1, 5-й Предпортовый проезд	Не выполнены требования Постановления Правительства СПб от 06.10.2016 № 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории СПб в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории СПб", в части пунктов 11.5 (выполнено без перекрытия).	20.11.18	
